

AGÊNCIA PARA A  
MODERNIZAÇÃO  
ADMINISTRATIVA



**SAMA**  
SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

11 DE FEVEREIRO DE 2015



# E AGORA?



# SAMA – OS NÚMEROS FALAM POR SI


## 8 AVISOS + 5 CONVITES:

- 583 PROJETOS APRESENTADOS
- 295 OPERAÇÕES APROVADAS
- 56 OPERAÇÕES ANULADAS
- 133 OPERAÇÕES EM EXECUÇÃO
- 99 OPERAÇÕES COM EXECUÇÃO <80%
- 76 OPERAÇÕES COM EXECUÇÃO <50%
- 27 OPERAÇÕES SEM EXECUÇÃO



## SAMA – OS NÚMEROS FALAM POR SI

## Execução total por aviso

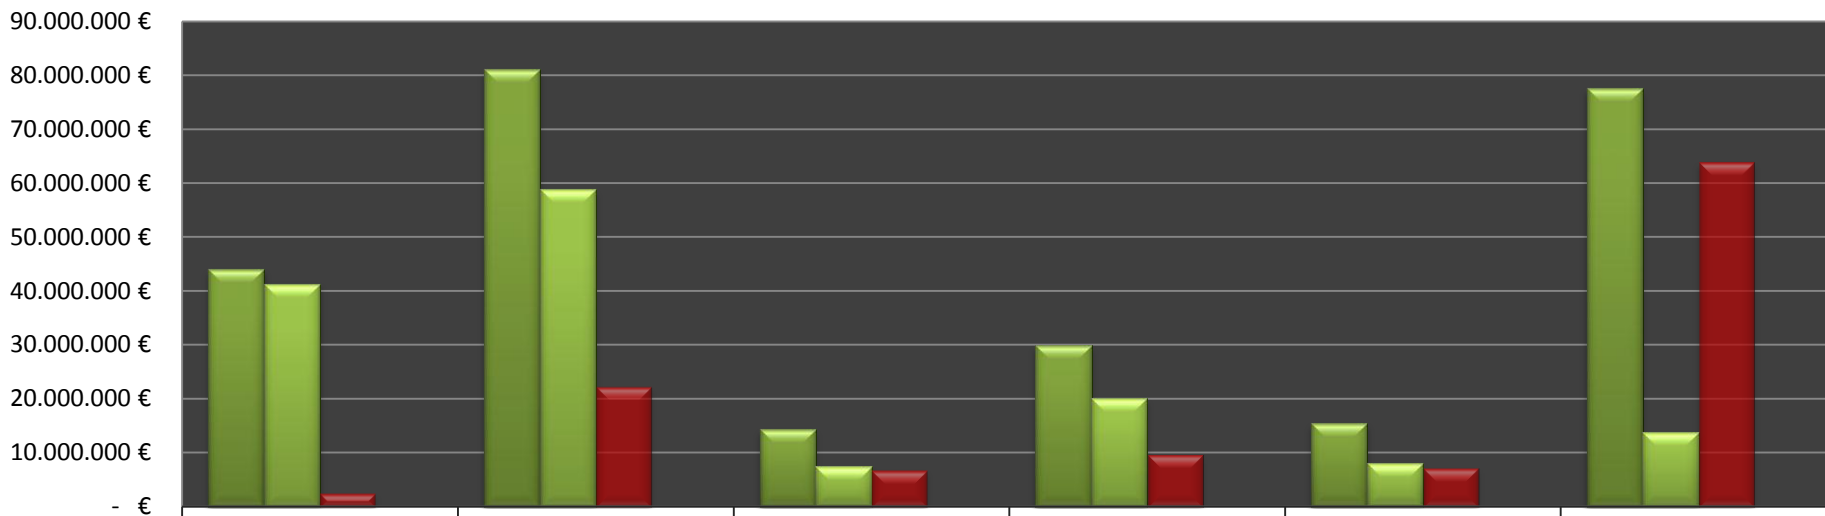


**POR EXECUTAR: 112.706.161,37 €**

# HÁ UM ANO ATRÁS....

## DESAFIOS:

- EXECUTAR PROJETOS EM TEMPOS REDUZIDOS
- PROMOTORES POUCO FAMILIARIZADOS COM FERRAMENTAS E NORMAS DO COMPETE
- ELEVADO N.º DE OPERAÇÕES E GRANDE DESCENTRALIZAÇÃO – OBRIGAM A ESFORÇO ACRESCIDO NO ACOMPANHAMENTO DAS MESMAS



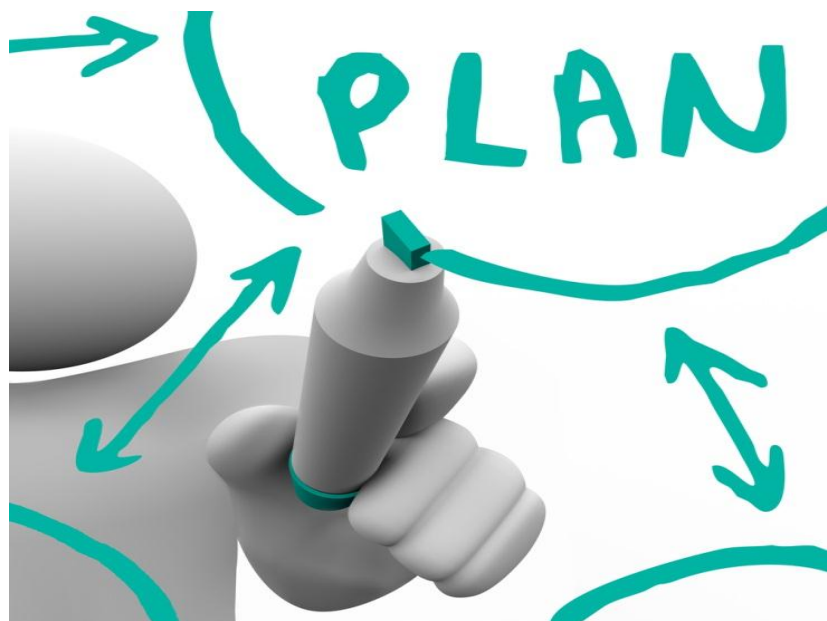

## PLANEAMENTO FINANCEIRO

- ✓ PREVISÃO DAS DATAS DAS FATURAS
- ✓ PLANEAR CALENDÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS PEDIDOS DE PAGAMENTO

## PLANEAMENTO FÍSICO

- ✓ QUAIS OS RESULTADOS QUE ME COMPROMETI A ATINGIR
- ✓ ESTOU A MEDIR OS MEUS INDICADORES

## CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR

- ✓ CONTRATAÇÃO PÚBLICA
- ✓ NORMAS E REFERÊNCIAS TÉCNICAS
- ✓ CONTRATO DE FINANCIAMENTO

## QUESTÕES MAIS CRÍTICAS NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES

- DIFICULDADE NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS APROVADOS
- DESVIOS FÍSICOS E FINANCEIROS
- DIFICULDADES NA INSCRIÇÃO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL
- DIFICULDADES NA UTILIZAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DO INCENTIVO
- CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES CONTRATUALIZADAS
- ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES



# E QUAL É A SAÍDA?

## TOMAR DECISÕES...

- TEMOS UM PLANEAMENTO RIGOROSO DAS ATIVIDADES DO PROJETO?
- CONSEGUIMOS EXECUTAR FINANCEIRAMENTO DENTRO DO PRAZO APROVADO?
- FORAM CONSIDERADOS EVENTUAIS CONSTRAGIMENTOS?
- CONSEGUIMOS CUMPRIR OS OBJETIVOS APROVADOS?



# CENÁRIO 1 – EXECUÇÃO NOS TERMOS APROVADOS

- AS ATIVIDADES ESTÃO PLANEADAS E O PLANO ESTÁ A SER CUMPRIDO
- FOI APRESENTADO O PLANEAMENTO À AMA, E ESTÁ DE ACORDO COM O APROVADO
- AS DATAS PREVISTAS PARA APRESENTAÇÃO DE DESPESA SERÃO CUMPRIDAS
- OS OBJETIVOS E RESULTADOS APROVADOS SERÃO CONCRETIZADOS



**MANTER A EXECUÇÃO PLANEADA E APROVADA**



## CENÁRIO 2 – ATRASO NA EXECUÇÃO

- AS ATIVIDADES ESTÃO PLANEADAS, MAS A EXECUÇÃO ESTÁ ATRASADA FACE AO APROVADO
- FOI APRESENTADO O PLANEAMENTO À AMA, E NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O APROVADO
- AS DATAS PREVISTAS NO PLANO PARA APRESENTAÇÃO DE DESPESA SERÃO CUMPRIDAS E AS DATAS DAS FATURAS SERÃO ANTERIORES A 30 SETEMBRO 15
- OS OBJETIVOS E RESULTADOS APROVADOS SERÃO CONCRETIZADOS



**SOLICITAR REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL E MANTER A EXECUÇÃO CONFORME PLANEADA E APROVADA**

# CENÁRIO 3 – PLANEAMENTO NÃO EXEQUÍVEL – REDUÇÃO DE INCENTIVO

- AS ATIVIDADES ESTÃO PLANEADAS, E A EXECUÇÃO ESTÁ ATRASADA FACE AO APROVADO
- FOI APRESENTADO O PLANEAMENTO À AMA, E NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O APROVADO
- AS DATAS PREVISTAS DAS FATURAS DE ALGUMAS ATIVIDADES SÃO POSTERIORES A 30 SETEMBRO 15
- OS OBJETIVOS E RESULTADOS APROVADOS SERÃO APENAS PARCIALMENTE CONCRETIZADOS DENTRO DO PRAZO



## PONDERAR UM REDIMENSIONAMENTO DA OPERAÇÃO:

- REDUÇÃO DE INCENTIVO
- REPROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS (REANÁLISE DE MÉRITO)

## CENÁRIO 4 – PLANEAMENTO NÃO EXEQUÍVEL – RESCISÃO

- AS ATIVIDADES ESTÃO PLANEADAS, E A EXECUÇÃO ESTÁ ATRASADA FACE AO APROVADO
- FOI APRESENTADO O PLANEAMENTO À AMA, E NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O APROVADO
- AS DATAS PREVISTAS DAS FATURAS SÃO POSTERIORES A 30 SETEMBRO 15
- OS OBJETIVOS E RESULTADOS APROVADOS NÃO SERÃO CONCRETIZADOS DENTRO DO PRAZO



**RESCISÃO CONTRATUAL**



# PRAZOS E DATAS LIMITE

**DATA LIMITE DA ÚLTIMA FATURA:** DATA DE FIM DE PROJETO (NUNCA POSTERIOR A 30 DE SETEMBRO DE 2015);

**DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE SALDO FINAL (PTRF E APF):** 90 DIAS APÓS A DATA DA ÚLTIMA FATURA – ATÉ 31 DE DEZEMBRO TODA A DESPESA DEVE ESTAR PAGA E SUBMETIDA;

**DATA LIMITE PARA A AMA ANALISAR E CERTIFICAR A DESPESA:** 1 A 3 MESES APÓS 31 DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES A EMITIR PELA AD&C E IGF, DEVENDO ATÉ ESSA DATA SER EFETUADO O ENCERRAMENTO DO INVESTIMENTO, OU SEJA A REALIZAÇÃO DA VISITA E O ENCERRAMENTO NO SISTEMA;



# DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS

## CENTRO DE CONTATO DO SAMA:

TELEFONE: 21 721 55 99

MAIL: SAMA\_SUPORTE@AMA.PT



TEMOS INFORMAÇÃO DE SUPORTE ATUALIZADA NO SITE DA AMA

<http://www.ama.pt/sama.html>

PLATAFORMA DE ACESSO SIMPLIFICADO



AGÊNCIA PARA A  
MODERNIZAÇÃO  
ADMINISTRATIVA



Obrigada!

Ana Pio – Coordenadora Estrutura Apoio Técnico SAMA  
ana.pio@ama.pt

